



Para:

Câmara Municipal de Nazaré

Av. Vieira Guimarães, 54

2450-951 Nazaré

**N/ Ref.:** 02.2018 - NR

**Data:** 09-02-2018


**ASSUNTO:** Empreitada "Requalificação da Avenida Manuel Remígio (Marginal Sul) 27/2017-PPC" –  
Pedido de prorrogação de prazo

Ex. mo Senhor Presidente,

Estando esta empresa a realizar os trabalhos relativos à empreitada em epígrafe e uma vez que em diversos troços da obra estão previstos e em execução trabalhos a cargo dos Serviços Municipalizados da Nazaré, e que as condições climatéricas verificadas não permitem a execução dos trabalhos previstos (nomeadamente pavimentações em calçada, betuminoso e betão), não nos tem sido possível executar os trabalhos com o rendimento planeado, nem é expectável que seja possível nas próximas semanas, sendo necessário que o prazo de execução da obra seja prorrogado.

Assim, serve o presente para solicitar uma prorrogação do prazo de execução de obra por um período de 60 dias.

Com os melhores Cumprimentos,

  
\_\_\_\_\_  
Nelson Rodrigues, Eng. Civil – Dir. Obra



## PLANO DE PAGAMENTOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO


**EMPREITADA** : "Requalificação da Avenida Manuel Remígio (Marginal Sul) 27/2017-PPC"

**Dono da Empreitada**: Município da Nazaré

**Prazo de execução da empreitada**: 120 DIAS

DESIGNAÇÃO DOS CAPÍTULOS	DIAS					
	Auto 1 - 30/11/2017	Auto 2 - 26/12/2017	Auto 3 - 29/01/2018	Auto 4 - 28/02/2018	Auto 5 - 29/03/2018	Auto 6 - 13/04/2018
1 - ESTALEIRO	875,00 €	300,00 €	175,00 €		600,00 €	600,00 €
2 - DEMOLIÇÕES	1 800,48 €		5 196,54 €	1 903,82 €	9 905,16 €	
3 - PAVIMENTOS E LANCIS	3 720,00 €	10 380,00 €	23 526,46 €	8 081,80 €	93 328,49 €	46 664,25 €
4 - SINALIZAÇÃO						1 309,25 €
5 - TRAVESSIAS			517,00 €		3 463,00 €	
6 - DIVERSOS			500,00 €		7 276,67 €	3 638,33 €
<b>Total Mensal (valor)</b>	<b>6 395,48 €</b>	<b>10 680,00 €</b>	<b>29 915,00 €</b>	<b>9 985,62 €</b>	<b>114 573,32 €</b>	<b>52 211,83 €</b>
<b>Total Mensal Acumulado (valor)</b>	<b>6 395,48 €</b>	<b>17 075,48 €</b>	<b>46 990,48 €</b>	<b>56 976,10 €</b>	<b>171 549,42 €</b>	<b>223 761,25 €</b>
<b>Total Mensal (%)</b>	<b>2,86%</b>	<b>4,77%</b>	<b>13,37%</b>	<b>4,46%</b>	<b>51,20%</b>	<b>23,33%</b>
<b>Total Mensal Acumulado (%)</b>	<b>2,86%</b>	<b>7,63%</b>	<b>21,00%</b>	<b>25,46%</b>	<b>76,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DA PROPOSTA</b>	<b>223 761,25 €</b>					

### GRÁFICAMENTE

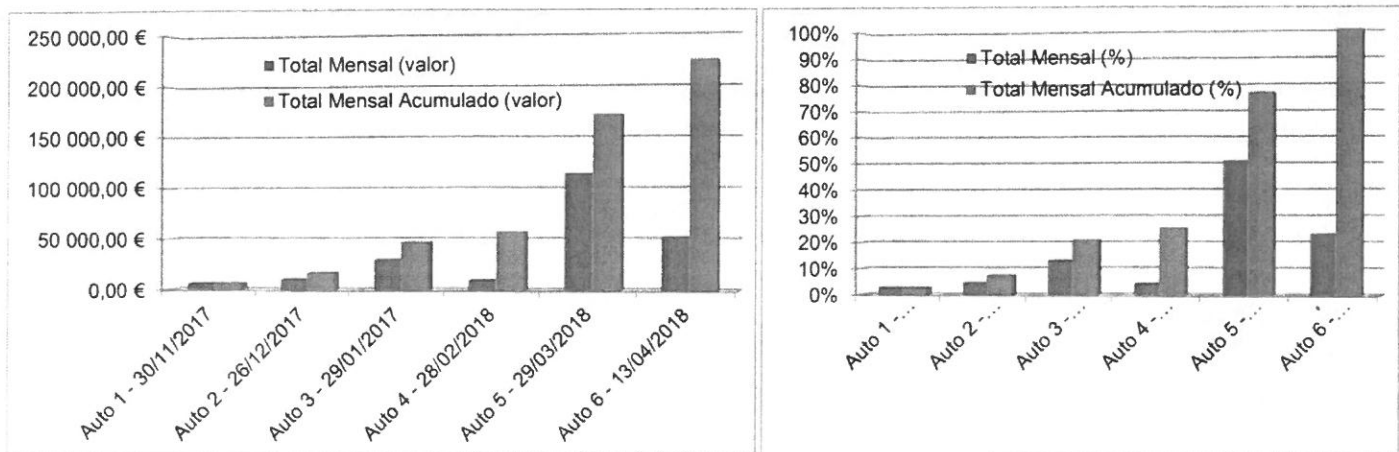

Perulhal, 09 de Fevereiro de 2018

**MATOS & NEVES, LDA.**  
A Gerência



